


本資料は 年 月 日付で

登録区分変更する。 [技術展開部技術協力課]

# 高 速 実 驗 炉 「 常 陽 」

## プラント管理月報

1981年10月分

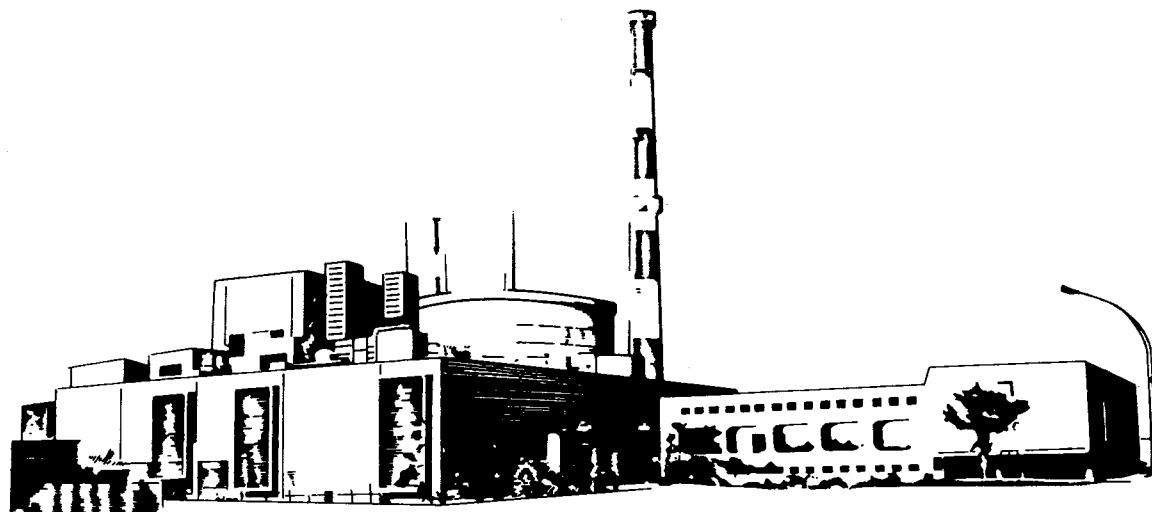

動力炉・核燃料開発事業団

この資料は動燃事業団の開発業務を進めるため限られた関係者だけに配布するものです。したがってその取扱いには充分注意を払って下さい。なお、この資料の供覧、複製、転載、引用等には事業団の承認が必要です。



# 高 速 実 驗 炉 「常 陽」

## プ ラ ン ト 管 理 月 報

### 目 次

第 1 章 常陽の概要	1
1. 1 常陽の経過	1
1. 2 月間運転実績工程およびプラント状態表	2
第 2 章 系統の運転	6
2. 1 原子炉および制御系	6
2. 2 冷却系	6
2. 3 純化系	6
2. 4 燃料取扱系	7
2. 5 その他の系統	7
第 3 章 放射線管理	8
3. 1 概 要	8
3. 2 放射性廃棄物	8
3. 3 管理区域内作業状況	8
3. 4 一時管理区域等の設定	8
3. 5 作業環境の放射線	8
3. 6 個人被曝管理	8
3. 7 放射性物質等の移動	8
3. 8 環境管理測定結果	9
第 4 章 保 守	20
4. 1 概 況	20
4. 2 定期検査	20
4. 3 点 檢	20
4. 4 修理依頼票、異常等報告書	21
4. 5 修理報告書	22
4. 6 ナトリウム機器の洗浄	23
第 5 章 燃料管理	24
5. 1 概 要	24
5. 2 燃料移動	24
5. 3 在 庫 量	24

第6章	技術開発	26
6.1	特性試験	26
6.2	サーベイランス試験	26
6.3	照射（後）試験	26
6.4	保守技術の開発	27
6.5	運転技術の開発	27
第7章	工事	28
7.1	主要工事の概要	28
7.2	原子炉規制法関係	28
7.3	改造計画書・改造報告書	30
第8章	技術資料	32
8.1	技術報告書	32
8.2	運転データ	32

# 第1章 常陽の概要

## 1.1 常陽の経過

先月より行われていた特殊運転は4日まで継続され、1日には原子炉出力1MWの1次系自然循環、2、3日には10°Cステップの等温係数測定(250°C~170°C~250°C)のため原子炉はそのつど臨界にされた。

4日には燃料集合体流量分布測定準備のため、流量105%状態で原子炉を臨界にし、制御棒の浮上り確認試験が実施された。その後原子炉は停止され保守点検が実施された。保守点検と並行して12日~16日には燃料集合体流量分布測定が行われた。また、21、22日に燃料移送が行われ、23~25日に75MW第6サイクルの炉心燃料が装荷され、炉心構成が完了した。

26日からは起動前点検が開始され手動アイソレーション試験、系統圧損測定、流量計較正等が実施された。

11月2日に75MW第6サイクル運転が開始される予定である。

今月の炉心構成要素の移送はサーベイランス1体をFMFへ、炉心燃料、ダミ要素各1体をパルヘ、MK-I改造型炉心燃料3体を炉内貯蔵ラックへ収納した。

炉心燃料等取扱では1C1、1E1、1F1位置へMK-I改造型炉心燃料を装荷した。

MK-I改造型炉心燃料集合体組立作業は9月28日終了し10月7日に使用前検査が実施された。

MK-II制御棒現地寸法検査が10月19~23日に実施された。

今月実施した保守点検は下記の通りである。

- 1) フレオン冷凍機B号機 9月24日~10月7日
- 2) 廃棄物処理系プロセス計器較正 10月19日~29日
- 3) 84系プロセス計器較正 9月28日~10月20日
- 4) 放射線管理設備 8月17月~10月16日

今月実施した改造工事は下記の通りである。

- 1) 無停電々源設備 10月5日~8日
- 2) 圧縮供気供給系、除湿塔まわり改造 10月12日~16日
- 3) 廃液処理、蒸気ドレン排水ピット土木工事 7月29日~10月31日

今月25日には大洗変電所の定期定検が実施され商用電源は停電となった。またボイラ設備の定期検査が実施された。

今月の原子炉起動回数、最大出力、運転時間等は次のとおりである。

原子炉起動回数	4 回
最大原子炉出力	1 MW
積算原子炉出力 (当月積算)	$5.98351 \times 10^5$ MWH 2.25 MWH)
積算原子炉運転時間 (当月積算)	11838.0 時間 40.68 時間)

## 1.2 月間運転実績工程表およびプラント状態

本月の運転実績およびプラント状態は、表 1-1、表 1-2 に示すとおりである。

また、75 MW定格第6サイクル時の炉心構成を図 1-1 に示す。

表1-1 高速実験炉「常陽」実績工程表 (S. 56. 10)


項目	年月日	S・56・10																															
		1	②	③	④	5	6	7	8	9	⑩	⑪	12	13	14	15	16	⑯	⑰	⑧	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
特記事項	PNC 創立記念日																																
	自然循環試験 等温係数測定																																
運転、保守、試験	フレオノン冷凍機(B)点検																																
	E/H開																																
施設整備	無停電源設備改造工事																																
	廃液処理、蒸気ドレン排水ピット土木工事																																
MK-I改造型炉心燃料集合体製作	炉内装荷準備																																
	炉内移送																																
	炉内装荷																																

表 1-2 高速実験炉「常陽」プラント状態表 (S. 56. 10)

年月日 項目	S・56・10																															
	1	②	③	④	5	6	7	8	9	⑩	⑪	12	13	14	15	16	⑰	⑯	19	20	21	22	23	24	㉕	26	27	28	29	30	31	
主要工程	自然循環試験																															
	等温系数測定																															
原子炉出力	無停電々源改造																															
炉内状況	制御棒浮き上り確認																															
冷却系統	フレオノン冷凍機 (B) 点検																															
	84系プロセス計器較正																															
	2次系主送風機ベーン補修																															
	廃棄物処理系プロセス計器較正																															
	ボイラ設備点検																															
	75MW-(6) 炉心																															
	原子炉停止																															

# 炉心構成図

基準方位 (T・R・側)

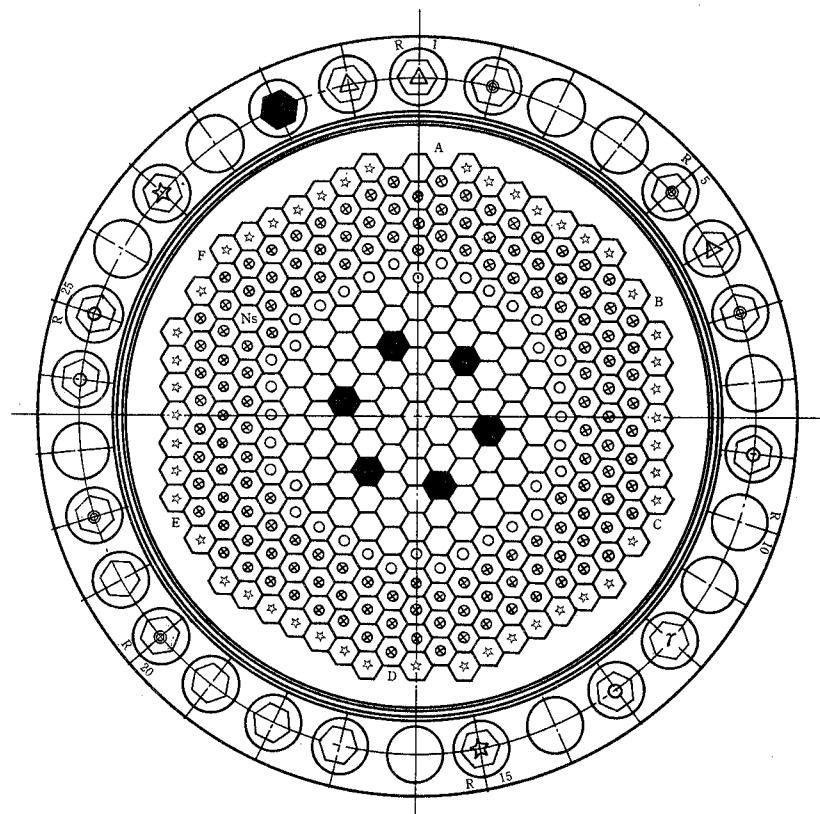

○ 燃料集合体

NS 中性子源

● 制御棒

D ダミー要素

◎ 内側プランケット燃料集合体

◎ サーベイランス

◎ 外側プランケット燃料集合体

△ 特殊燃料集合体

☆ 反射体

γ γ線源収能体

炉心構成		
構成要素名	員数	
炉心燃料	79	
プランケット	内側	外側
	36	143
制御御棒	調整棒	安全棒
	2	4
反射体	スリット有	スリット無
	12	36
中性子源	1	

図1-1 75 MW定格第6サイクル運転 (1981. 11. 2 ~ 12. 27)

## 第2章 系統の運転

### 2.1 原子炉および制御棒

自然循環試験のため、1日に1MWまで出力上昇を行い、試験終了後停止した。

2日から3日にかけて $10^4$  cps 保持状態で等温係数測定試験が行われた。

4日には炉内流量分布測定（制御棒浮上り確認試験）が行われ、MK-I炉心での1次主冷却系流量100%以上においても制御棒の浮上りがないことが確認された。

9日に“停止”モードより“燃交”モードへの移行があり、26日には再び“停止”モードとし手動アイソレーション試験が行われ、又、75MW-(6)サイクルの起動前確認が開始された。

### 2.2 冷却系

10月中冷却系は、1次系、2次系とも基本的には系統温度約250°Cで運転された。

ただし、10月1日には自然循環試験のため原子炉出口温度が最高で約330°Cの状態で運転され、10月2日、3日にかけて、等温係数測定のため1次系、2次系とも170°Cまでの低温状態での運転が行われた。

又、10月8日には無停電系電源の改造工事の関係で1次系、2次系とも予熱N<sub>2</sub>ガスによる200°Cでの運転が行われた。

1次系及び2次系流量は各種の試験や工事のため大きく変動したがその主要なものは次のとおりである。

- 10月1日 自然循環試験のため1次系2次系とも流量0。
- 10月4日 制御棒浮き上り試験のため1次系流量105%。
- 10月6日～8日 無停電系電源改造工事のため1次系はポンーモーター流量又は流量0。  
2次系は流量0。
- 10月12日～16日 炉内流量分布測定のため90%流量を中心に0～100%に流量変動。
- 10月25日 所内全停電のため1次系はポンーモーター流量。2次系は流量0。

なお、10月26日から、75MW第6サイクル起動前確認が実施された。1次系、2次系とも温度250°C、流量100%運転となり起動前点検にともなう1次系流量の変更、停止が27日、29日に実施された。

### 2.3 純化系

1次Na純化系は、コールドトラップ圧損が先月に引き続き高目の状態であったため10月3日までは純化流量 $12\text{ m}^3/\text{hr}$ 、コールドトラップ設定温度150°Cでのコールドトラップ再生運転を行った。

10月3日以後はNaサンプリングの期間を除きコールドトラップ設定温度を135°Cまで下げ、純化流量を $14\text{ m}^3/\text{hr}$ とし“流量増加によるコールドトラップ再生運転”を月末まで行った。なおこの

期間のコールドトラップ圧損は約  $1.3 \text{ kg/cm}^2$  で安定していた。

2次Na 純化系はNa サンプリングの期間を除き純化流量が  $4 \text{ m}^3/\text{hr}$  , コールドトラップ設定温度が  $120^\circ\text{C}$  の一定運転であった。

今月中の各系統のプラキング温度は下記の通りであった。

	プラキング温度
1 次 系	$140^\circ\text{C}$ 以下
2 次 系	$127 \sim 137^\circ\text{C}$
2 次補助系	$125 \sim 130^\circ\text{C}$

## 2.4 燃料取扱系

回転プラグ, フリーズシールメタル, メルトを8日に行い, 交換機孔プラグの引抜, 案内スリーブの装荷による燃料出入機の運転を9日に行った。12日～16日までの流量分布測定による回転プラグの運転を行った。75 MW第6サイクル運転用炉心構成の為, 19日から23日まで燃料交換作業を実施した。燃料移送本数は新炉心構成要素改造型燃料3体使用済燃料3体である。

上記作業終了後, 燃料出入機のグリッパ洗浄を21日～22日に, 燃料交換機のグリッパ洗浄を23日～24日にそれぞれ実施した。

回転プラグ, フリーズシールメタル, フリーズを24日に実施した。

## 2.5 その他の系統

格納容器雰囲気は, 床下(窒素), 床上(空気)の通常雰囲気状態において, 床下5 mm Aq, 床上10 mm Aqに, また, 10月5日～10月19日, 10月25日～10月28日の間, 機器搬入口が開放され, この間, 床下0 mm Aq, 床上0 mm Aqに圧力制御が行われ, 床下酸素濃度は, 4%以下に管理された。なお, 機器搬入口開放の間, アニュラス部排気ファンは停止された。

格納容器雰囲気調整系の機器は, 順調に運転を継続し, フレオンターボ冷凍機, 格納容器, 給・排気ファン, アニュラス部排気ファン,  $\text{N}_2$  再循環ファンおよび機器冷却ファンの予備機への定側切替が実施された。

フレオンターボ冷凍機の定期点検は, 10月7日すべて完了した。今月の液体 $\text{N}_2$ 及びArの受入量と空調系, 補機系の給水量は下記の通りである。

液 体 $\text{N}_2$	44252 kg
液 体 Ar	7233 kg
空調系給水量	$1144 \text{ m}^3$
補機系給水量	$1025 \text{ m}^3$

## 第3章 放射線管理

### 3.1 概要

今月は、特殊試験運転が継続され、10月4日臨界運転を終了し又各設備の点検・調整が行なわれた。これらに伴う管理区域内の空間線量率分布、放射性物質濃度、表面汚染密度等の管理測定を実施したが、異常は認められなかった。

### 3.2 放射性廃棄物

#### (1) 排気および排水

排気（総排気量:  $1.0 \times 10^8 \text{ m}^3$ ）については検出感度未満（排気放出量:  $0 \mu\text{ci}$ ）であった。

排気（一般排水）はなかった。なお、燃料及び機器等の洗浄廃液（廃液量:  $33 \text{ m}^3$ 、放射性物質  $968.0 \mu\text{ci} (\beta\alpha)$ 、 $3.35 \mu\text{ci} (\alpha)$ ）は原研廃棄物処理場へ廃液輸送管で移送された。

#### (2) 固体廃棄物

$\beta\alpha$  低レベル固体廃棄物（カートンボックス可燃: 277、不燃: 190、フィルター: プレ3、ヘパ: 15）を廃棄物処理建家に運搬し、一時保管した。

### 3.3 管理区域内作業状況

管理区域内作業計画書一覧を表3-1に示した。

### 3.4 一時管理区域等の設定

改造燃料移送のため10月12日付属建家～IRAF間に、使用済燃料搬入のため10月22日常陽～F MF間にそれぞれ設定された。

### 3.5 作業環境の放射線

異常は認められなかった。

### 3.6 個人被曝管理

従事者及び随時立入者の全身被曝線量分布について昭和56年7～9月分を表3-2、表3-3に示す。

一時立入者の被曝線量は表3-4に示す。

### 3.7 放射性物質等の移動

一次系ナトリウム（1件）、一次系アルゴンガス（1件）各試料をナトリウム分析棟へ搬出した。

### 3.8 環境管理測定結果

大洗地区環境評価委員会による環境管理測定結果を表3-5に示す。

表 3-1 管理区域内作業計画一覧

昭和 56 年 10 月

作業名	作業場所	作業期間	作業担当課
1次系ガスクロの点検・修理	R407 (F F D 室)	10/5	原子炉第1課
使用済燃料貯蔵設備プール内使用済燃料集合体のプール内移送	A604 . 511A	9/28~10/30	" "
燃料取扱設備・循環ポンプ真空ポンプ分解点検	A209 . 211 . 212	9/28~10/31	"
「常陽」燃料取扱設備計器整備	R501.R601 A212.510.604	9/28~11/20	"
燃取系シーケンス改造工事	R501 . A510 . 604	9/28~11/30	"
回転プラグ、燃料洗浄設備計器点検	格内・付属建家	9/28~11/27	"
燃料交換機ドアバルブ改造工事	R501	10/5~10/20	"
炉心構成要素体積測定	A511 . 513 . 514 510 . 511B	10/5~10/16	原子炉第1課 照射課
廃アルコールタンクへのアルコール廃液注入	A106	10/6~7	原子炉第1課
燃料洗浄設備まわり等整備工事	A209 . 210 . 211 212	10/5~11/30	"
キャスクカーパイプ手直し作業	A510	10/12~16	"
缶詰缶移動搬入	I-114 . 117 トラックヤード	10/23	"
旧案内スリーブ I 取出作業	R501	10/26	"
燃取設備弁点検	R410 . A510 . 308	10/28~11/20	"
燃料洗浄設備液面計取付	A308	10/29~11/25	"
缶詰缶及びフリーズメタル注排出装置の移送作業	トラックヤード組立室, I-117	10/28~29	"
295 R T ターボ冷凍機点検	A-102	9/9~10/15	原子炉第2課
付属空調設備のフィルター交換 (FL 92-9A)	A215	10/5	"
原子炉格納容器機器搬出入口開閉作業	R501	10/5~31	"
メンテナンス台車ケーブル補修	メンテナンス	10/7~10	"
センタ孔プラグ洗浄作業	メンテナンス	10/12~24	"
付属空調フィルターの交換 (FL 92-5A)	A311	10/13	"
廃液処理用蒸気ドレンピット設備工事	廃棄物処理建家廃液 タンク室蒸発缶室	10/19~12/10	"
付属空調系圧力計の点検	A410	10/19	"
中性子検出器保持駆動装置ch 5 補修	R501	10/19~21	"
1次Ar ガスサンプリング設備補修	R501	10/21~22	"
常陽ピット蓋開閉工事	R501	10/26~28	"
床上O <sub>2</sub> 計点検	R601 . A518	10/21~27	"

表3-1 管理区域内作業計画一覧

昭和56年10月

作業名	作業場所	作業期間	作業担当課
廃棄物処理系プロセス計製品の校正試験	A 104. 106. 108. 109	10/19 ~ 30	原子炉第2課
手動アイソレーション試験	A 206	10/26	"
F F D・C G法第1V/T廻鉛しゃへい 体設置	R 407	10/30 ~ 31	"
エリアモニタ点検用足場取付工事	A 306	10/30 ~ 11/12	"
炉心内流量分布測定装置の据付徹去	R 501	10/9 ~ 22	技術課
F F T F遮蔽情報交換	原子炉建家・付属建家	10/21	"
M K-I改造型炉心燃料集合体組立	I RAF組立室, 試験検査室	9/18 ~ 10/12	照射課
改造型燃料集合体構内輸送作業	A 513. 514 I RAF建家, トラックヤード組立室	10/12	"
I R A F建家組立室壁塗装工事	I R A F組立室	10/15 ~ 31	"
I R A F建家通信追加工事等	I R A F建家	10/19 ~ 11/20	"
I R A F居室検査室間仕切工事	I - 209	10/15 ~ 22	"
ページング調整	I R A F	10/20 ~ 22	"
常陽M K-II INTA上部構造試作およ び全体組立	I R A F組立室	10/20, 10/26~30	"
F M F集合体移送キャスクによる搬出	水冷却池室	10/22	"
ダミー燃料洗浄作業	A 511 B 水冷却池室トラックヤード	10/26 ~ 11/4	"
常陽INTA上部構造試作および全体組 立ニクロプレーズ高周波ろう付	I R A F組立室	10/27 ~ 30	"
試料保管棚の据付	I - 116	10/30 ~ 31	"
蒸発缶濃縮液固化作業	処理建家	10/5 ~ 7	廃棄物処理課
濃縮液固化体キャッピング作業	"	10/12 ~ 14	"
廃液ポンプシール水配管改造工事	D 104. 102	10/19 ~ 31	"
保健物理計装設備点検整備	管理区域全域	8/17 ~ 10/31	放射線管理課
T/R保守室内γ線エリアモニタ点検	アニュラス・A 310	10/15 ~ 16	"

表3-2 従事者全身被曝線量分布

昭和56年7,8,9月

被ばく線量 (rem) 所 属	対象数 (人)	X (人)	0.01以上 0.13未満 (人)	0.13以上 0.4未満 (人)	0.4以上 1.3未満 (人)	1.3以上 3.0未満 (人)	3.0以上 (人)	総被ばく 線量 (man•rem)	平均被ばく 線量 (rem)	最大被ばく 線量 (rem)
実験炉部	職員	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	業者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2	2	0	0	0	0	0	0	0
管理課	職員	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	業者	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	合計	12	12	0	0	0	0	0	0	0
一課	職員	55	52	3	0	0	0	0.06	0	0.02
	業者	75	65	10	0	0	0	0.14	0	0.03
	合計	130	117	13	0	0	0	0.20	0	0.03
二課	職員	24	24	0	0	0	0	0	0	0
	業者	43	41	2	0	0	0	0.04	0	0.03
	合計	67	65	2	0	0	0	0.04	0	0.03
技術課	職員	21	21	0	0	0	0	0	0	0
	業者	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	合計	22	22	0	0	0	0	0	0	0
照射課	職員	14	10	4	0	0	0	0.16	0.01	0.07
	業者	13	6	7	0	0	0	0.31	0.02	0.09
	合計	27	16	11	0	0	0	0.47	0.02	0.09
安管部 放射線管理課	職員	9	5	4	0	0	0	0.11	0.01	0.03
	業者	7	6	1	0	0	0	0.03	0	0.03
	合計	16	11	5	0	0	0	0.14	0.01	0.03
廃棄物処理課	職員	4	2	2	0	0	0	0.07	0.02	0.05
	業者	6	1	5	0	0	0	0.08	0.01	0.03
	合計	10	3	7	0	0	0	0.15	0.02	0.05
工務課	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	7	6	1	0	0	0	0.01	0	0.01
	合計	7	6	1	0	0	0	0.01	0	0.01
総務課	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	合計	6	6	0	0	0	0	0	0	0
合計	職員	133	120	13	0	0	0	0.40	0	0.07
	業者	166	140	26	0	0	0	0.61	0	0.09
	合計	299	260	39	0	0	0	1.01	0	0.09

表 3-3 隨時立入者全身被曝線量分布

昭和 56 年 7, 8, 9 月

被ばく線量 (rem) 所 属	対象 人 数 (人)	X (人)	0.01 以上 0.13 未満 (人)	0.13 以上 0.4 未満 (人)	0.4 以上 1.3 未満 (人)	1.3 以上 3.0 未満 (人)	3.0 以上 (人)	総被ばく 線量 (man·rem)	平均被ばく 線量 (rem)	最大被ばく 線量 (rem)
原 一	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	30	28	2	0	0	0	0.10	0	0.05
	合計	30	28	2	0	0	0	0.10	0	0.05
原 二	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	46	46	0	0	0	0	0	0	0
	合計	46	46	0	0	0	0	0	0	0
技 術 課	職員	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	業者	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	合計	14	14	0	0	0	0	0	0	0
照 射 課	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	11	11	0	0	0	0	0	0	0
	合計	11	11	0	0	0	0	0	0	0
放 管 課	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	合計	7	7	0	0	0	0	0	0	0
処 理 課	職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業者	11	8	3	0	0	0	0.04	0	0.02
	合計	11	8	3	0	0	0	0.04	0	0.02
合 計	職員	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	業者	117	112	5	0	0	0	0.14	0	0.05
	合計	119	114	5	0	0	0	0.14	0	0.05
	職員									
	業者									
	合計									
	職員									
	業者									
	合計									
	職員									
	業者									
	合計									
	職員									
	業者									
	合計									
	職員									
	業者									
	合計									

表 3-4 一時立入者等の被曝線量

昭和56年10月

管 理 区 域 内 立 入 者 区 分	延 人 数	被 曝 者 数 (人)			最 高 被 曝 線 量 (ミリレム)	備 考
		検出限界 未 満	10 ミリレム以上 30 ミリレム未満	30 ミリレム以上		
一 時 立 入 者 見 学 者 等	5 3 3 2 1	5 3 3 2 1				
合 計	3 7 4	3 7 4				

表 3-5 大洗地区環境監視測定結果

(昭和 56 年度 2 四半期)

記録、昭和 56 年 10 月 22 日

## 1. 空間線量 (率)

大洗地区環境評価委員会

項目	測定月 機器名等	7 月		8 月		9 月		備考
		平均	最大	平均	最大	平均	最大	
空間 線 量 率	ポスト ( $\mu R/h$ )	No. 1	10	10	10	10	10	
		No. 2	10	10	10	10	10	
		No. 3	10	10	10	10	10	
		No. 4	10	10	10	10	10	
		No. 5	10	10	10	10	10	
		No. 6	10	10	10	10	10	
		No. 7	10	10	10	10	10	
		No. 8	10	10	10	10	10	
		No. 9	10	10	10	10	10	
		No. 10	10	10	10	10	10	
		No. 11	10	10	10	10	10	
		No. 12	10	10	10	10	10	
		No. 13	10	10	10	10	10	
		No. 14	10	10	10	10	10	
		No. 15	10	10	10	10	10	
		No. 16	10	10	10	10	10	
	ステーション ( $\mu R/h$ )	No. 1	3	5	3	6	3	5
		No. 2	3	4	3	6	3	5
測定日 月日 ( $\mu R/h$ )	測定地点		測定値		測定地点		測定値	
	飛沢入口				外周道路(B 地点)			
	旭村中学校				大場小学校			
	上鹿田称念寺				田村学園			
	大谷川神護教会				大洗神社			
	大洗町旧陣屋				原研厚生ハウス			
	外周道路(A 地点)				動燃グランド			
積算 線量	TLD 測定期間 自 6 月 18 日 至 9 月 18 日 (92 日間) (mR)	測定点	測定値	測定点	測定値	測定点	測定値	クロス チェック (大洗南中学校)
		No. 1	9	No. 11	9	No. 21	8	
		No. 2	10	No. 12	10	No. 22	8	原研 8
		No. 3	9	No. 13	12	No. 23	8	
		No. 4	9	No. 14	10	No. 24	8	動燃 7
		No. 5	10	No. 15	8	No. 25	8	
		No. 6	10	No. 16	7	No. 26	8	
		No. 7	9	No. 17	10	No. 27	8	
		No. 8	10	No. 18	8	No. 28	7	
		No. 9	10	No. 19	7	No. 29	7	
		No. 10	8	No. 20	8	No. 30	6	

2. 全 $\beta$ 放射能測定結果

項目	試料名	7月	8月	9月	3ヶ月平均
		平均	平均	平均	
大 氣	ステーションNo.1 ( $10^{-14} \mu\text{Ci}/\text{cm}^3$ )	2.4	2.6	2.3	2.4
	ステーションNo.2 ( $10^{-12} \mu\text{Ci}/\text{cm}^3$ )	2.2	2.7	2.1	2.3
	ステーションNo.3 ( $10^{-12} \mu\text{Ci}/\text{cm}^3$ )	4.7	4.3	4.0	4.3
降下塵	( $\text{mCi}/\text{cm}^3$ )	7月 2.0	8月 1.6	9月 0.9	

備考

	試料名	採取月日	測定値	備考
陸 水	夏海湖水	( $\mu\text{Ci}/\text{cm}^3$ )		
	涸沼湖水			
	原研水道原水			
	町営水道原水			
	北松川水道水			
	北松川井戸水			
土 壤	海岸放出口	( $\text{PCi}/\text{g} \cdot \text{乾}$ )	7.7	13
	処理場			
	日中内			
	下太田			
	飛沢			
上 農 蓄 產 物	精米	( $\text{PCi}/\text{g} \cdot \text{生}$ )		
	野菜( )			
	松葉(原研構内)		7.15	4
	牛乳		7.28	1
海 洋	L海域	( $\mu\text{Ci}/\text{cm}^3$ )	7.23	$5.6 \times 10^{-10}$
	M海域		7.23	$4.8 \times 10^{-10}$
	L海域	( $\text{PCi}/\text{g} \cdot \text{乾}$ )	7.23	14
	M海域		7.23	17
	シラス	( $\text{PCi}/\text{g} \cdot \text{生}$ )	7.22	3
	アワビ		8.18	2
	アカガイ			
	ヒジキ			
	カジメ			

### 3. トリチウム濃度測定結果

項目	試 料 名	採取月日	測 定 値	備 考
陸 水	夏 海 湖 水	( pCi/cm <sup>3</sup> )		
	涸 沼 湖 水			
	原 研 水 道 原 水			
	町 営 水 道 原 水			
	北 松 川 水 道 水			
	北 松 川 井 戸 水			
海 水	L 海 域	7. 2 3	< 0.5 × 10 <sup>-1</sup>	
	M 海 域	7. 2 3	< 0.5 × 10 <sup>-1</sup>	

### 4. 放射性核種分析測定結果

#### (1) 大気中の塵埃

項 目	大 气 中 の 嘉 埃					
	ス テ ー シ ョ ン ( μCi/cm <sup>3</sup> )			降 下 嘉 ( mCi/km <sup>2</sup> )		
採 取 地 点	No. 1	No. 2	No. 3	原 研 構 内		
採取月 分析核種	7月～9月	7月～9月	7月～9月	7月	8月	9月
<sup>54</sup> Mn	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>60</sup> Co	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>95</sup> Zr	1.8 × 10 <sup>-15</sup>	2.7 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.5 × 10 <sup>-15</sup>	6.3 × 10 <sup>-2</sup>	5.6 × 10 <sup>-2</sup>	< 2.0 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>95</sup> Nb	3.9 × 10 <sup>-15</sup>	4.8 × 10 <sup>-15</sup>	2.8 × 10 <sup>-15</sup>	19 × 10 <sup>-2</sup>	9.7 × 10 <sup>-2</sup>	2.4 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>106</sup> Ru	< 1.0 × 10 <sup>-14</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-14</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-14</sup>	1.0 × 10 <sup>-1</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-1</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-1</sup>
<sup>137</sup> Cs	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	3.0 × 10 <sup>-2</sup>	1.7 × 10 <sup>-2</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>144</sup> Ce	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-15</sup>	2.9 × 10 <sup>-1</sup>	2.2 × 10 <sup>-1</sup>	< 1.0 × 10 <sup>-1</sup>
備 考						

(2) 土壤、排水口近辺土砂

項目	土壤 (pCi/g・乾)				排水口近辺土砂 (pCi/g・乾)
	飛沢	下太田	日中内	処理場	
採取地点	月 日	月 日	月 日	月 日	海岸放出口
分析核種					
<sup>54</sup> Mn					
<sup>60</sup> Co					$< 3.0 \times 10^{-2}$
<sup>95</sup> Zr					
<sup>95</sup> Nb					
<sup>106</sup> Ru					
<sup>137</sup> Cs					$< 3.0 \times 10^{-2}$
<sup>144</sup> Ce					
備 考					

(3) 農畜産物

項目	農畜産物			
	牛乳 (pCi/cm <sup>3</sup> ・生)	野菜 (pCi/g・生)	精米 (pCi/g・生)	松葉 (pCi/g・生)
採取地点	旭村鹿田	旭村田崎	旭村田崎	原研構内
分析核種	採取月日	7月28日		7月15日
<sup>54</sup> Mn				$1.6 \times 10^{-2}$
<sup>60</sup> Co				$< 1.0 \times 10^{-2}$
<sup>95</sup> Zr				$2.8 \times 10^{-1}$
<sup>95</sup> Nb				$6.1 \times 10^{-1}$
<sup>106</sup> Ru				$1.2 \times 10^{-1}$
<sup>131</sup> I	$< 5.0 \times 10^{-3}$			
<sup>137</sup> Cs	$< 1.0 \times 10^{-2}$			$3.6 \times 10^{-2}$
<sup>144</sup> Ce				$5.6 \times 10^{-1}$
備 考				

(4) 海水, 海底土

項 目	海 水 ( pCi / cm³ )		海 底 土 ( pCi / g・乾 )	
	L 海 域	M 海 域	L 海 域	M 海 域
採取・海 域	L 海 域	M 海 域	L 海 域	M 海 域
分析核種	採取月日	7月23日	7月23日	7月23日
<sup>54</sup> Mn	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 3.0 \times 10^{-2}$	$< 3.0 \times 10^{-2}$
<sup>60</sup> Cp	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 3.0 \times 10^{-2}$	$< 3.0 \times 10^{-2}$
<sup>90</sup> Sr *			$< 1.0 \times 10^{-2}$	$< 1.0 \times 10^{-2}$
<sup>95</sup> Zr	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 5.0 \times 10^{-2}$	$< 5.0 \times 10^{-2}$
<sup>95</sup> Nb	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$7.3 \times 10^{-2}$	$8.7 \times 10^{-2}$
<sup>106</sup> Ru *			$< 2.0 \times 10^{-2}$	$< 2.0 \times 10^{-2}$
<sup>137</sup> Cs	$< 2.0 \times 10^{-4}$	$< 2.0 \times 10^{-4}$	$< 3.0 \times 10^{-2}$	$< 3.0 \times 10^{-2}$
<sup>144</sup> Ce *			$6.6 \times 10^{-2}$	$8.7 \times 10^{-2}$
備 考	*化学分析			

(5) 魚類, 貝類, 海藻類

項 目	魚 類 ( pCi/g・生 )		貝 類 ( pCi/g・生 )		海 藻 類 ( pCi / g・生 )	
	シ ラ ス	カ レ イ(注)	ア ワ ビ	ア カ ガ イ	ヒ ジ キ	カ ジ メ
採取 地 点	大 洗 沖			大 洗 海 岸		
分析核種	採取月日	7月22日	5月14日	8月18日	月 日	月 日
<sup>54</sup> Mn	$< 6.0 \times 10^{-3}$		$< 6.0 \times 10^{-3}$			
<sup>60</sup> Co	$< 6.0 \times 10^{-3}$		$< 6.0 \times 10^{-3}$			
<sup>90</sup> Sr *	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$			
<sup>95</sup> Zr	$< 1.0 \times 10^{-2}$		$1.1 \times 10^{-2}$			
<sup>95</sup> Nb	$< 0.5 \times 10^{-2}$		$1.4 \times 10^{-2}$			
<sup>106</sup> Ru *	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$3.5 \times 10^{-3}$			
<sup>137</sup> Cs	$7.5 \times 10^{-3}$		$< 6.0 \times 10^{-3}$			
<sup>144</sup> Ce *	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-3}$			
備 考	*化学分析					
(注) 第1. 四半期に一部未報告のため今期報告						

## 第4章 保 守

### 4.1 概 情

今月の自主点検、定期自主点検及び定期検査は以下に示す通りである。

#### 1) 自主点検

下記の項目について自主点検を実施し、良好であった。

1. 格納容器雰囲気調整系フレオノンターボ冷凍機点検
2. 圧縮空気供給系現場計器設定器較正試験
3. 廃棄物処理系プロセス計装品較正試験
4. FFD-CG法計装品点検
5. 燃料出口温度計装盤点検
6. 格納容器雰囲気調整系計器点検

#### 2) 定期自主点検

下記の項目について定期自主点検を実施し良好であった。

1. 手動アイソレーション試験 注1)
2. 原子炉保護系の定期自主検査 注2)

#### 3) 定期検査

下記の項目について定期検査を実施し良好であり合格した。

1. ボイラー設備点検
2. 放管棟ストレージタンク点検

注1) 手動アイソレーション試験は、原子炉施設保安規定第156条第2項ロにもとづき毎年1回実施している。

注2) 原子炉保護系の定期自主検査は、原子炉施設保安規定第156条第1項イにもとづき毎月1回実施している。

### 4.2 定期検査

今月実施された、法令にもとづく定期検査は次の通りである。

No.	法 令	検 査 内 容	月 日	検 査 官
1	労 働 基 準 法	炉筒煙管式ボイラー性能試験	56.10.29	中 山 檢 査 官
2	"	放管棟ストレージタンク性能検査	"	"

### 4.3 点 検

今月発行した保守報告書は、次の通りである。

No.	発行番号	件名	期間	担当課
1	原2-56-30	圧縮空気供給設備現場計器設定器較正試験	56.10.5 ~10.16	原2課
2	" - 38	「常陽」バッテリー設備自主点検	56.9.7 ~9.18	"
3	" - 40	原子炉保護系の定期自主検査(9月分)	56.9.8 ~9.21	"
4	" - 41	圧縮空気供給系圧縮機点検	56.9.16 ~9.24	"
5	" - 45	F F D - C G 法計装品点検	56.10.20	"
6	" - 46	燃料出口温度計装盤点検	56.10.21	"
7	" - 47	原子炉保護系の定期自主検査(10月分)	56.10.27 ~10.30	"
8	原1-56-A 001	F F D L シールフランジ点検	56.8.19 ~8.21	原1課

#### 4.4 修理依頼票、異常等報告書

(1) 今月発行した修理依頼票は次の通りである。

No.	発行番号	系統名	件名	発行月日	発行課
1	原1-56-117	1次主冷却系	ポンプ吐出音響(A, B) 記録計チャート送り不良	S 56.10.2	原1課
2	" - 118	2次純化系	コールドトラップ送風機入口ダンパリミットスイッチ位置不良	" 10.2	"
3	" - 119	予熱N <sub>2</sub> ガス系	軸封プロア(A)トリップ	" 10.8	"
4	" - 120	2次補助冷却系	入口ペーンドライブユニット切替ハンドル折損	" 10.8	"
5	" - 121	付属空調換気系	No.1中制空調器コンプレッサーTrip	" 10.9	"
6	" - 122	2次Na純化系	コールドトラップ送風機ペアリングからの異音発生	" 10.10	"
7	" - 123	格納容器内圧空発生装置	格内ベビコン吐出弁操作回路異常	" 10.12	"
8	" - 124	予熱N <sub>2</sub> ガス系	炉壁温度データロガ不調	" 10.13	"
9	" - 125		航空障害灯ランプ切れ	" 10.13	"
10	" - 126	④空気調整系	主循環ポンプ上蓋室用西側軸流ファン不良	" 10.24	"
11	" - 127	非常用電源設備	No.1ディーゼル発電機燃料第2沪過器出口パッキン破損	" 10.25	"
12	" - 128	補機冷却系	2号D/G冷却塔出口ストレーナ目詰り	" 10.25	"
13	" - 129	圧縮空気供給系	MG 4入口バルブユニオン部Air漏れ	" 10.26	"
14	" - 130	非常系電源設備	非常系照明電源252S6(電喪後の自動投入不良)	" 10.26	"
15	" - 131	S F F 非常用電源設備	T R - 3の二次側51G 3接地継電器の動作	" 10.27	"
16	" - 132	④空気調整系	冷媒ポンプ(C)出口弁動作不良	" 10.29	"
17	" - 133	"	#A常用排気ファン異常	" 10.30	"
18	原2-56-13	主冷却機建家	主冷風洞室クレーン集電子の異常	" 10.8	原2課
19	" - 14	メンテナンスプール水処理設備	沪過脱塩機入口自動止弁不良	" 10.22	"

(2) 今月は異常に関する異常等報告書はなしである。

#### 4.5 修理報告書

今月発行した修理報告書は、次の通りである。

No.	発行番号	系統名	件 名	保修完了月日	担当課
1	原1-55-7	圧 空	圧空配管エアー漏れ補修	56.10.16	原2課
2	" -178	圧 空	圧空配管継手部補修	56.10.14	"
3	原2-55-6	圧 空	圧空配管ユニオン部からのエアー漏れ補修	56.10.14	"
4	" -8	圧 空	圧空タンク接続配管ユニオン部からのエアー漏れ補修	56.10.14	"
5	原1-56-17	空 調	A-フレオン冷凍機油ストレーナ交換	56.10.9	"
6	" -46	火 報	SFF建家火災検知器交換	56.9.10	"
7	" -52	火 報	SFF建家火報の点検	56.10.16	"
8	" -60	2 次	2A入口ベーン開度発振器補修	56.7.22	"
9	" -69	空 調	A, Bフレオン冷凍機油圧計蒸発圧力計点検	56.10.9	"
10	" -70	貫通部冷却	冷却系もどり配管保温材補修	56.9.18	"
11	" -74	1次Na サンプリング	S/P用グローブBOXの真空引き用バルブ交換	56.10.14	"
12	" -82	1次Arガス	1次ArガスS/P装置ポット吊手補修	56.10.21	"
13	" -101	空 調	ホット配管室給気ファンNo.2出口ダンパ調査	56.10.9	"
14	" -102	空 調	No.1給気ファン出口ダンパ調節器取手折損	56.10.1	"
15	" -107	照 明	A-305 A-306ハロゲン灯配管路照明スイッチ交換	56.10.13	"
16	" -113	Ar 廃ガス	バルブ操作用三方電磁弁補修	56.9.29	"
17	" -115	2次補助	予熱ヒータスキャニングコントローラ補修	56.9.30	"
18	" -118	2次純化	コールドトラップ送風機入口ダンパリミットスイッチ交換	56.10.15	"
19	" -120	2次補助	入口ベンドライブユニット切替ハンドル交換	56.10.19	"
20	" -122	2次純化	コールドトラップ送風機ベアリング交換	56.10.16	"
21	" -125	-	航空障害灯ランプ交換	56.10.26	"
22	" -12	電 源	No.1D/G発電機燃料第2沪過器出口パッキン交換	56.10.25	"
23	" -128	補 冷	No.2D/G冷却塔出口ストレーナ清掃	56.10.26	"
24	" -129	圧 空	MJ 4入口バルブユニオン部補修	56.10.30	"
25	原2-56-9	メンテナンス用設備	メンテナンス台車用ケーブル交換	56.10.8	"
26	" -14	プール水処理設備	沪過脱塩機入口自動止弁用電磁弁コイル交換	56.10.22	"
27	照 -56-4	SFF空調	SA-4B給気ファン補修	56.9.6	"
28	" -5	SFF空調	EA-3D排気ファン補修	56.9.6	"

No.	発行番号	系統名	件名	保修完了月日	担当課
29	照 - 56 - 9	S F F 空調	中央監視盤と中央制御室間警報回路調査	56. 9. 8	原 2 課
30	56 - T - 4	ボイラー	No.3 ボイラー缶水ブローパイプ補修	56. 9. 10	"

#### 4.6 ナトリウム機器の洗浄

今月実施したナトリウム機器の洗浄は、次の通りである。

No.	発行番号	洗淨機器	期間	洗淨槽	担当課
1	原 2 - 56 - 7	センター孔プラグ	10.15~10.16	高レベル洗浄槽	原 2
2	原 2 - 56 - 8	燃料集合体、流量分布測定装置	10.19~10.21	"	"

## 第5章 燃 料 管 理

### 5.1 概 要

10月12日照射装置組立検査施設から改造燃料3体、炉心燃料1体の受け入れが行われた。

11月2日からの75MW第6サイクル定格運転に先立ち燃料交換が行われた。

F MFへ照射後試験のためブランケット燃料1体サーベイランス1体の払い出しが行われた。

10月26日～10月31日に、昭和56年度第2回目の核燃料物質実在庫量の確認を行った。

(10月30日、IAEA、科技庁の立会のもとで封印の健全性確認を行った。)

### 5.2 燃 料 移 動

- 新燃料の受け入れ……………なし
- 新燃料の炉内移送（新燃料貯蔵位置→ラック）

10月20日 炉心燃料 PPJ W1F

10月20日 炉心燃料 PPJ W1G

10月21日 炉心燃料 PPJ W1H

- 使用済燃料等の燃料ラックからの取り出し

10月20日 サーベイランス TTJ T 08

10月20日 炉心燃料 PPJ D 2M

- 使用済燃料のF MFからの受け入れ……………なし

- 使用済燃料等のF MFへの払い出し

10月20日 サーベイランス TTJ T 08

10月20日 ブランケット燃料 NFJ M 18

- 新燃料の照射装置組立検査施設からの受け入れ

10月12日 炉心燃料 PPJ D 1K

改造燃料 PPJ W1F

PPJ W1G

PPJ W1H

### 5.3 在 庫 量

在庫量は別表に示す。

別表 実験炉内在庫量一覧 (昭和56年10月末現在)

貯蔵場所 国籍	核物質量 プルブルトニウム量 (kg)		濃縮ウラン量 (kg)		劣化ウラン (kg)		貯蔵集合体数 (本)	備考
	Pu量	Pu total量	U <sup>235</sup> 量	U total量	炉心用特殊燃料	炉心用特殊燃料		
新 燃 料 貯 庫	U.S.A	0.0	0.0	6.44	28.03	289.15	炉心用特殊燃料	3
	U.K	4.85	6.06	—	—	—	炉心用特殊燃料	0
							ブランケット燃料	6
							ブランケット用特殊燃料	1
	U.S.A	26.69	34.02	168.11	768.87	7712.58	炉心用特殊燃料	83
	U.K	99.50	126.41	—	—	—	炉心用特殊燃料	1
炉 内	U.S.A— U.K	24.54	24.71	—	—	—	ブランケット燃料	183
							ブランケット用特殊燃料	1
使 用 済  燃料貯蔵用 水冷却池	U.S.A	13.37	16.88	60.88	270.85	1633.26	炉心用特殊燃料	23
	U.K	32.09	40.36	—	—	—	炉心用特殊燃料	7
	U.S.A— U.K	1.98	1.99	—	—	—	ブランケット燃料	29
							ブランケット用特殊燃料	5
							中7体はFMF返却分	

## 第 6 章 技 術 開 発

### 6.1 特性試験

昭和 56 年 9 月 14 日からの特殊試験サイクル中に、以下の試験が実施された。

#### (1) 特殊試験

- 等温係数測定試験 10/2 ~ 10/3

原子炉入口 Na 温度を 250 °C と 170 °C の間で昇降温し、10 °C 毎に炉心余剰反応度を測定した。50MW 低出力試験での測定以降の炉心拡大、燃焼効果のデータを得るため実施した。

- 燃料集合体流量分布測定試験 10/4 ~ 10/16

炉内 73 集合体の出口 Na 流量を測定した。本試験は、50 MW 低出力試験での測定以降、炉心の拡大、燃焼効果、経年変化等の効果を調べることと、炉中心プラグの流速計の絶対較正の可能性を検討するためである。

### 6.2 サーベイランス試験

- 75 MW 第 5 サイクルにおいて反射体位置〔9 A 1〕で照射したサーベイランス・リブ(TT JT 08)を、FMS(照射燃料集合体試験室)へ返出した。(10月 20 日)
- 75 MW 第 4 サイクルにおいて照射した炉容器材(SUS 304)の材料試験片(引張・クリープ)の照射後試験を先月に引き継いで、MMS(照射材料試験室)にて実施中である。

### 6.3 照射(後)試験

#### (1) 照射後試験

燃料要素表面のウェアマーク観察のため、照射燃料集合体試験室(FMS)へ送られた炉心燃料集合体 2 体 PP JD OM 及び PP JD 2U のピン表面詳細外観検査が終了し、断面光顯観察結果が得られた。ウェアマークの幅は従来のものを越えていないし、断面深さも進展していない。これら 2 体の試験結果と従来のデータをまとめて科学技術庁へ報告した。

また、今月下旬には、ブランケット燃料集合体(NF JM 18)を照射後試験のため移送した。本集合体は臨界以来、75 MW 第 5 サイクルまで炉内で使用されたもので、集合体平均燃焼度が約 500 MWD/T である。

#### (2) 照射計画

燃料ウェアマークに関する照射試験集合体(改造型炉心燃料集合体)3 体の組立が終了し、官庁会検査に合格した。3 体の集合体は 10 月 19 日から 23 日にかけて原子炉内に装荷された。11 月に始まる 75 MW 第 6 サイクル中、炉心第 1 列で照射される予定である。これらの集合体は明年 2 月に 1 体、3 月に 2 体照射後試験施設へ送り出され、ウェアマークの外観検査による調査結果が明年夏までに得られる予定である。

## 6. 4 保守技術の開発

- (1) 塩害モニタリング装置の開発  
データ採取実施中
- (2) タンク内堆積物処理法の開発（含タンク洗浄設備）  
実機設計製作中
- (3) 赤外線カメラを用いた電源設備異常検出法の開発  
電源設備における初期データ採取
- (4) アルコール廃液処理技術の開発  
廃液による運転によりデータ採取
- (5) 異常診断装置の運用および開発推進  
シャコンブロワ、ペデタルブルワ振動データ採取、解析実施中  
又冷凍機振動データ採取段取中

## 6. 5 運転技術の開発

- (1) 圧空全停時のプラント特殊操作を確立した。

## 第 7 章 工 事

### 7.1 主要工事の概要

#### 1. 廃液処理用蒸気ドレンピット土木工事

- (1) 上塗り
- (2) 送、排風機、照明設備取付
- (3) 防水工事

### 7.2 原子炉規制法関係

今月の原子炉規制法にもとづく手続等の実績は次の通りである。

#### (1) 原子炉施設の変更申請

No.	件 名	申請番号	申請月日
	なし		

#### (2) 原子炉施設の変更許可

No.	件 名	認可番号	認可月日
	なし		

#### (3) 設計及び工事の方法の申請

No.	件 名	申請番号	申請月日
1	1次冷却系配管オイルダンパの交換	56動燃(高速) 038	56.10.21

#### (4) 設計及び工事の方法の認可

No.	件 名	認可番号	認可月日
	なし		

(5) 使用前検査申請

No.	件 名	申請番号	申請月日
	なし		

(6) 使用前検査

No.	系統名	機 器 名	検査項目	検査場所	検査期間及び担当官
1	原子炉本体	MK-I 改造型炉心燃料集合体	燃料集合体 (1) 材料検査 (2) 外観検査 (3) 尺寸検査 (4) 構成確認検査	動燃大洗工学センター	10月7日 篠崎検査官
2	"	炉心燃料集合体	炉心ペレット (1) 化学分析 (2) 外観検査 (3) 尺寸検査 (4) 密度検査 (5) 組織検査	動燃東海事業所	10月9日 折田検査官
3	"	"	"	"	10月16日 篠崎検査官

(7) 核燃料物質使用変更申請

No.	件 名	申請番号	申請月日
	なし		

(8) 核燃料物質使用変更許可

No.	件名	許可番号	許可月日
	なし		

(9) 施設検査申請

No.	件名	申請番号	申請月日
	なし		

(10) 施設検査

No.	系統名	機器名	検査項目	検査場所	検査期間及び担当者
		なし			

7.3 改造計画書・改造報告書

(1) 改造計画書

今月起案した改造計画書は、次の通りである。

No.	発行番号	系統名	件名	期間(予定)	担当課
1	原2-56-124	建家	原子炉付属建家水冷却池室扉取付工事	56. 11. 18 ～ 12. 3	原2課
2	" - 125	蒸気	廃棄物処理建家蒸気ドレン配管工事	56. 10. 19 ～ 10. 29	"
3	" - 126	-	エリアモニタ点検用足場取付工事	56. 10 ~	"
4	" - 127	2次Arガス	2次Arガス系圧力計の移設	57. 3. 15 ～ 3. 19	"
5	" - 128	2次	主送風機ブレーキ破損防止対策	57. 2. 16 ～ 2. 20	"
6	" - 129	建家	SFF建家水冷却池室天井クレーン制御器改造	56. 12. 1 ～ 12. 10	"

(2) 改造報告書

今月の改造報告書は、なしである。

## 第 8 章 技 術 資 料

### 8.1 技術報告書

今月発行した報告書は、つぎの通りである。

番号	件 名	資料番号
1	「常陽」原子炉技術プログレスリポート Vol 2 昭和55年7月～昭和55年9月	N 930-80-02
2	高速実験「常陽」プラント管理月報 1981年7月	S N 932-81-07
3	高速実験炉「常陽」性能試験報告書 高出力炉雑音特性第4報温度ゆらぎによるナトリウム流速推定	S N 941-81-88
4	高速実験炉「常陽」機器メンテナンスの実際 — 原子炉制御設備、核計装設備、燃料破損検出設備 —	S N 941-81-47
5	高速実験炉「常陽」機器メンテナンスの実際 — 原子炉冷却系統設備 —	S N 941-81-48
6	「常陽」原子炉技術プログレスリポート Vol 3 昭和55年10月～昭和55年12月	N 930-80-03
7	「常陽」原子炉技術プログレスリポート 昭和56年1月～3月	N 930-80-04
8	DOE-PNC Plant Experience Specialists Meeting on Power Ascension and Startup Experience (USDOE Presentations)	SA014 KWG 81-03
9	報告書第7回日英高速炉会議 1981年6月22日～6月26日	S B 042-81-01
10	SUMMARY VIEWGRAPHS FOR PNC/USDOE PEWG SPECIALISTS MEETING ON RADIOACTIVE MAINTENANCE AND OUTAGE PLANNING	(1)～(15) SA013 DWG 81-01

### 8.2 運転データ

今月整理した運転データはなしである。
